

第 12 回 山川東部校区学校跡地検討委員会

日時：令和6年7月17日（水）14時00分～

場所：山川東部支館

1. 開 会

2. 議 事

【学校跡地活用に関する現状について】

今年度の進捗状況は下記のとおりです。来年度以降のスケジュールは、配布している参考資料（みやま市学校跡地活用基本計画（抜粋））の４ページをご確認ください。


＜進捗状況＞

(1) 消防団格納庫の建築工事を開始

- ・令和6年7月16日から開始（土砂搬入）。今年度中に建築完了予定。

(2) 外周道路拡幅工事を開始

- ・令和6年7月12日（金）から工事開始。令和7年1月に完了予定。
- ・今年度は、下記平面図の区画を拡幅。

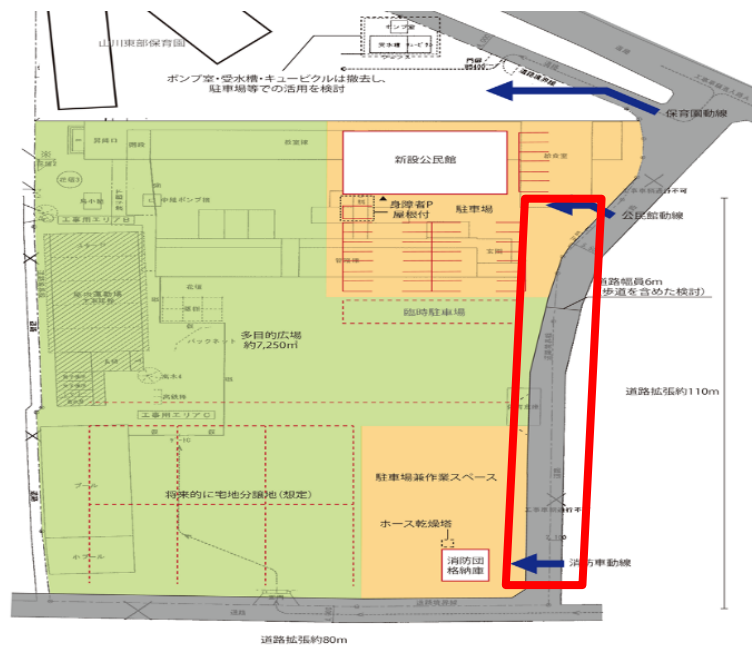

3. その他
